

臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

施 工 照 片


施工日期： 109年11月25日
 改善工程項目： 冷凝水槽連接閥件施工工程
 工作內容： 冷凝水槽舊有閥件拆卸



舊有閥件拆卸



舊有液位計拆卸

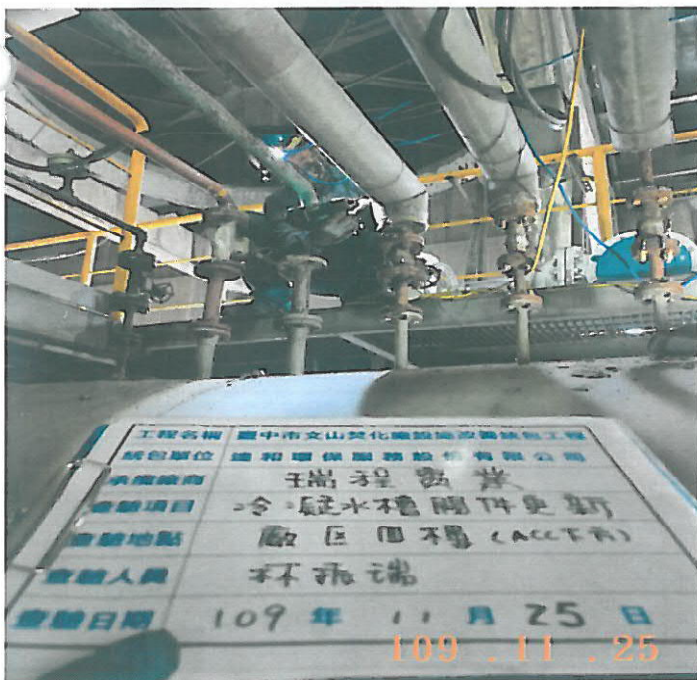

頂部閥件拆卸作業



底排閥件拆卸

臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

施 工 照 片

施工日期：109年11月26日

改善工程項目：冷凝水槽連接閥件施工工程

工作內容：冷凝水槽閥件更新作業



舊品閥件拆卸



新品閥件更換



液位計新舊品比對



液位計安裝

臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

施 工 照 片

施工日期: 109年11月28日
 改善工程項目: 冷凝水槽連接閥件施工工程
 工作內容: 冷凝水槽閥件更新作業



液位計更新



安全閥更新



手閥管路更新施工



底部放流閥更新

臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

施 工 照 片


施工日期： 109年12月01日
 改善工程項目： 冷凝水槽連接閥件施工工程
 工作內容： 冷凝水槽滿水試驗




冷凝水槽滿水檢查



冷凝水槽補水

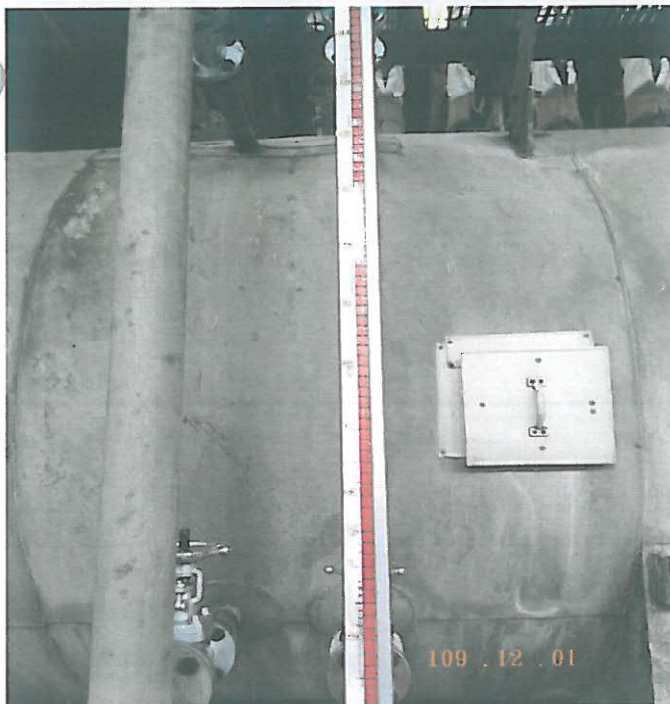

滿水補水完成

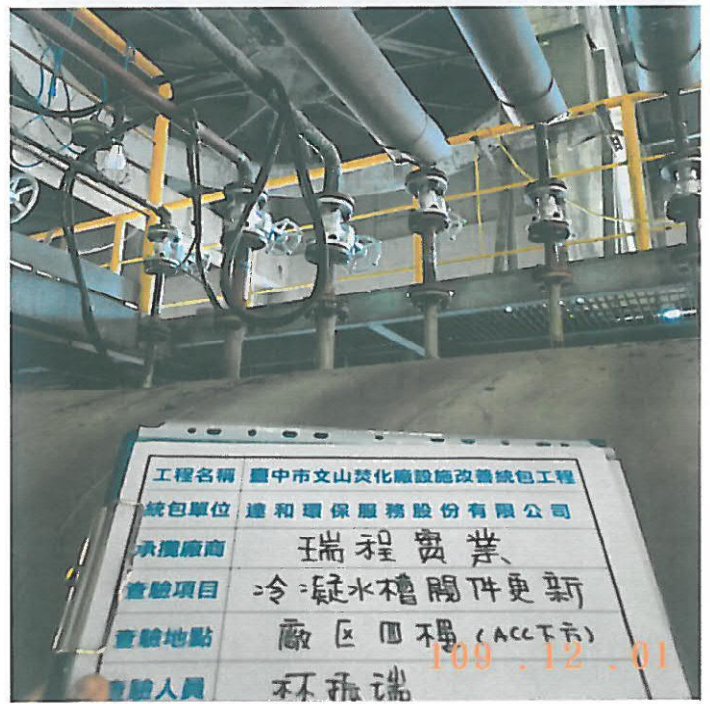

檢查閥件無洩漏

臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

施 工 照 片

施工日期：109年12月01日

改善工程項目：冷凝水槽連接閥件施工工程

工作內容：冷凝水槽閥件更新作業



手閥保溫包覆施工



包覆厚度檢查



手閥管路保溫包覆施工



包覆厚度檢查

臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

施 工 照 片

施工日期：109年12月01日

改善工程項目：冷凝水槽連接閥件施工工程


工作內容：冷凝水槽閥保溫查驗



會同監造檢查保溫包覆



閥體保溫包覆厚度：30mm

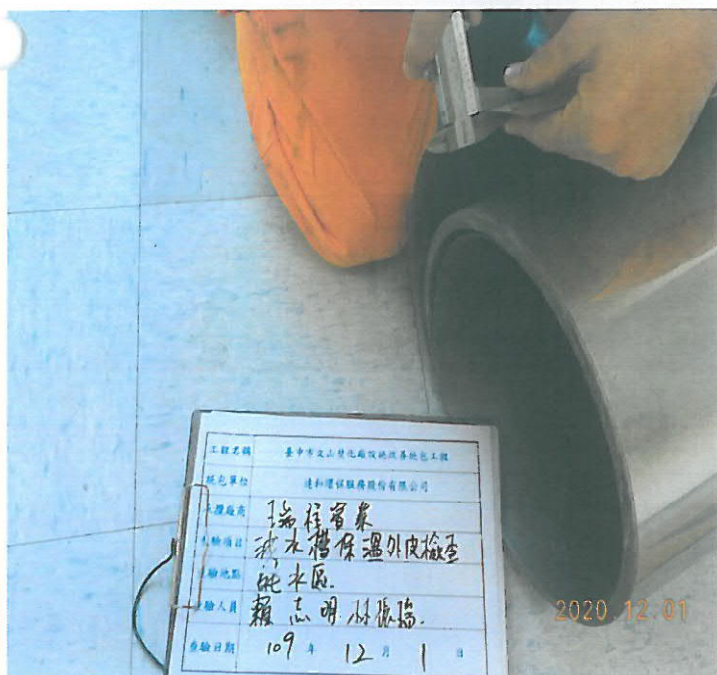

保溫鋁皮檢查



鋁皮厚度大於0.3mm

臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

施 工 照 片

施工日期： 109年12月05日

改善工程項目： 冷凝水槽連接閥件施工工程


工作內容： 冷凝水槽連接閥件




入口連接閥更新完成



入口連接閥更新完成

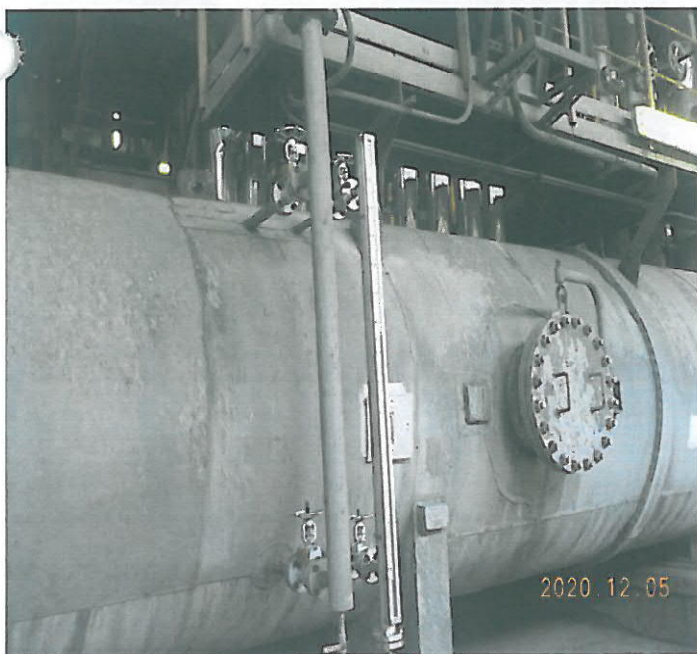

冷凝水槽液位計更新完成

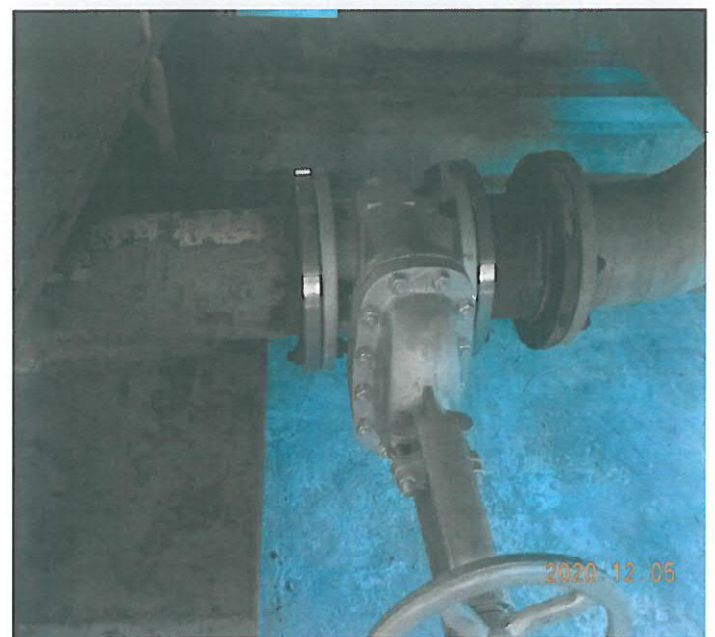

出口連接閥更新完成

臺中市文山焚化廠設施改善統包工程

施 工 照 片

施工日期： 109年12月06日

改善工程項目： 冷凝水槽連接閥件施工工程


工作內容： 冷凝水槽連接閥件




入口連接閥更新完成



入口連接閥更新完成

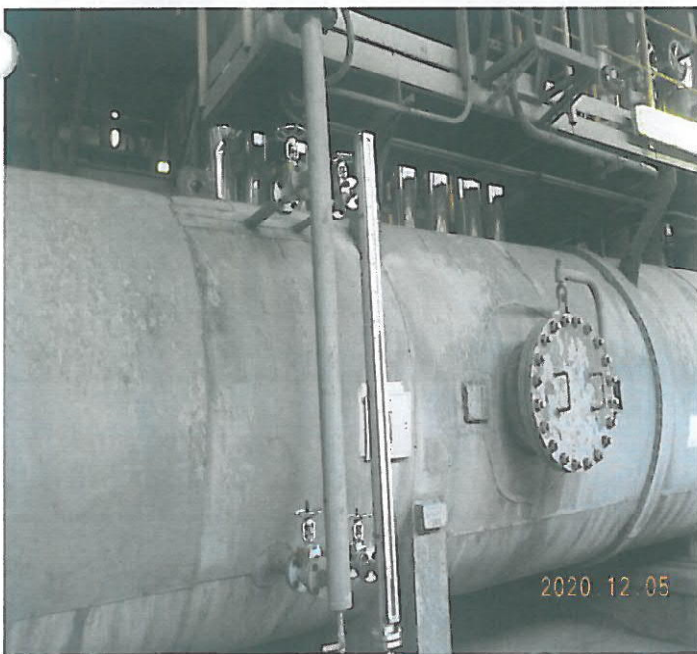

冷凝水槽液位計更新完成

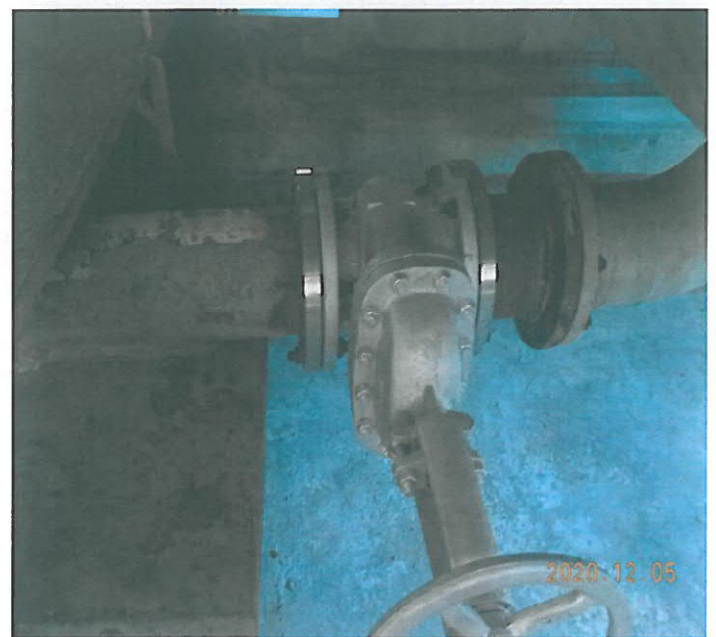

出口連接閥更新完成
